

장보고동상 어린이 테마 놀이공원 조성

사업구분

임기 내 완료
임기 후 지속

사업예산

예산사업
비예산사업

백만원

국비 도비
군비 민자

목표

○ 장보고 어린이 놀이공원에 놀이와 체험, 교육공간으로 전국 최고의 명소가 되도록 시설 확충하여 어린이 및 관광객들에게 여가생활을 할 수 있도록 하여 우리 군에 꼭 필요한 랜드마크의 장 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 장보고동상 내 장보고 어린이 놀이공원 일원
- 사업량 : 친환경 놀이공원(자가발전 놀이기구 설치) 조성
(모노레일 : 216M, 탑승부 : 12조, 회전시소 : 1조,
수평시소 : 1조, 유아회전놀이기구 : 1조, 그네 : 1조 등)
- 사업비 : 828백만원('19년 도비 500백만원, '20년 군비 328백만원)

■ 추진실적

- '19. 8. 28. : 친환경 조성사업 사업설명 보고회(군수님)
- '19. 10. 10. : 친환경 조성사업 공사 계약 의뢰(1차)
- '19. 11. 19. : 친환경 조성사업 공사 계약(1차)
- '20. 2. 20. : 친환경 조성사업 공사 준공 예정(1차)

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
친환경조성사업 - 전기공사	%	100		100				100
친환경조성사업 - 조경공사	%	100		50				50
친환경조성사업 - 관급자재	%	100		50				50
2020년 1월말 기준 공약 이행률								66

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
828	-	500	328	-	828	-	500	328	-	28	-	800	-

■ 향후 추진계획


- '20. 3. : 친환경 조성사업 공사 계약 예정(2차)
- '20. 6. : 친환경 조성사업 공사 준공 예정(2차)
- '20. 1.~ 12. : 연중 주요 시설물관리 및 환경정비 지속 추진

■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

○ 증빙자료(사진)

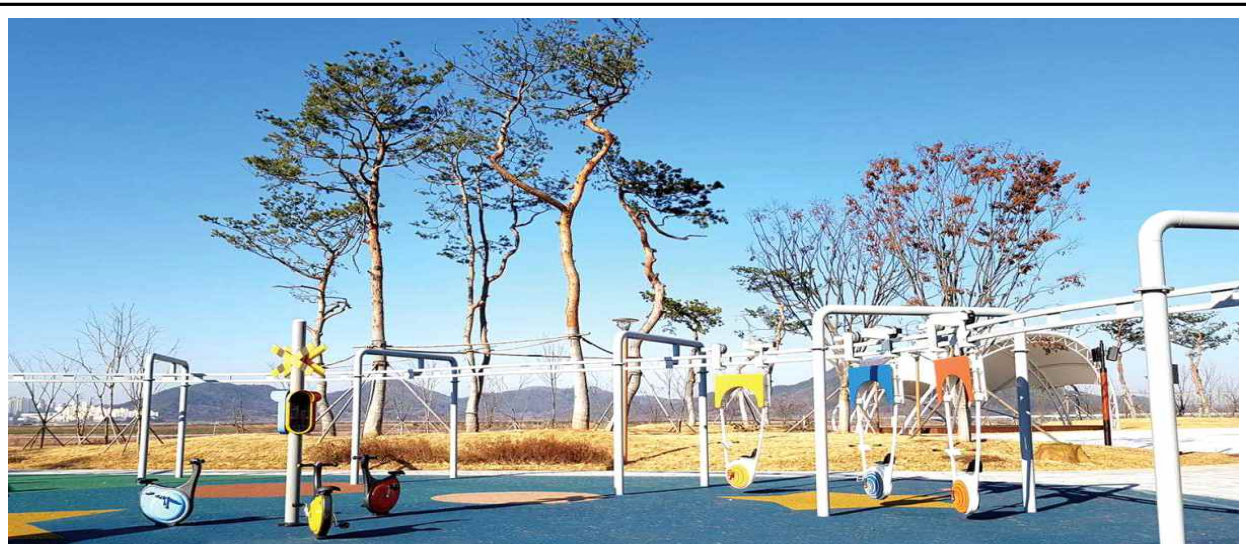

준공 조감도

주관부서

해양문화관광국장 허정수 문화예술과장 정광민 장보고선양팀장 김범일 담당자 유이식 (25481)
